




FASE 1 - REALIZZAZIONE PALI - La viabilità non viene modificata rispetto allo stato attuale a meno di restringimenti locali dovuti alle varie lavorazioni.

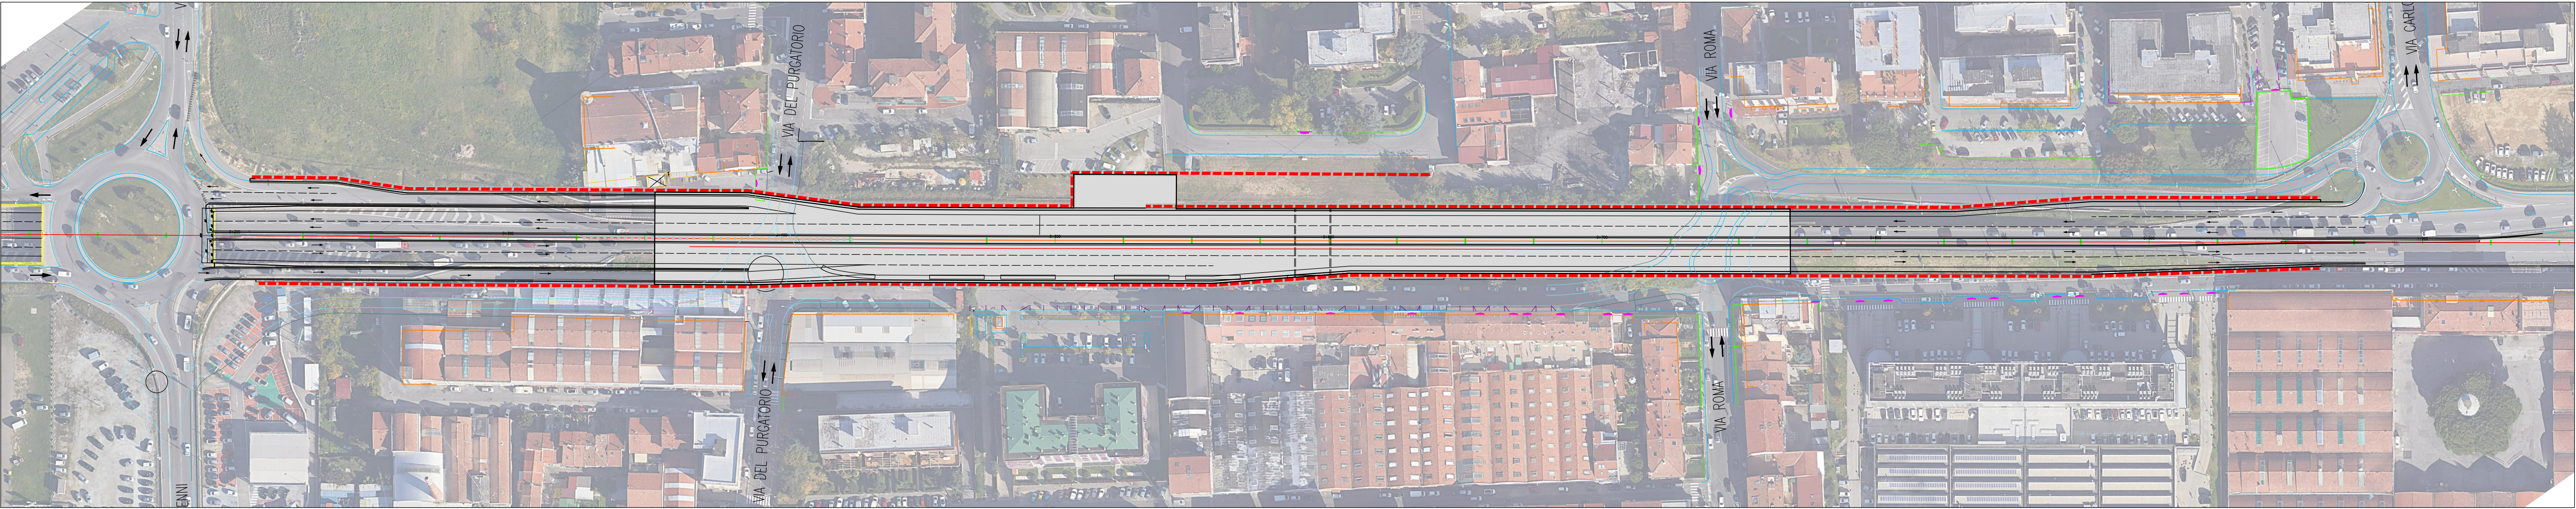


FASE 2 - REALIZZAZIONE TRATTO OVEST - La Declassata viene deviata sulla Complanare attraverso una rampa in prossimità di via Roma e con deviazione in prossimità di via Nenni; Chiusura di via del Purgatorio.

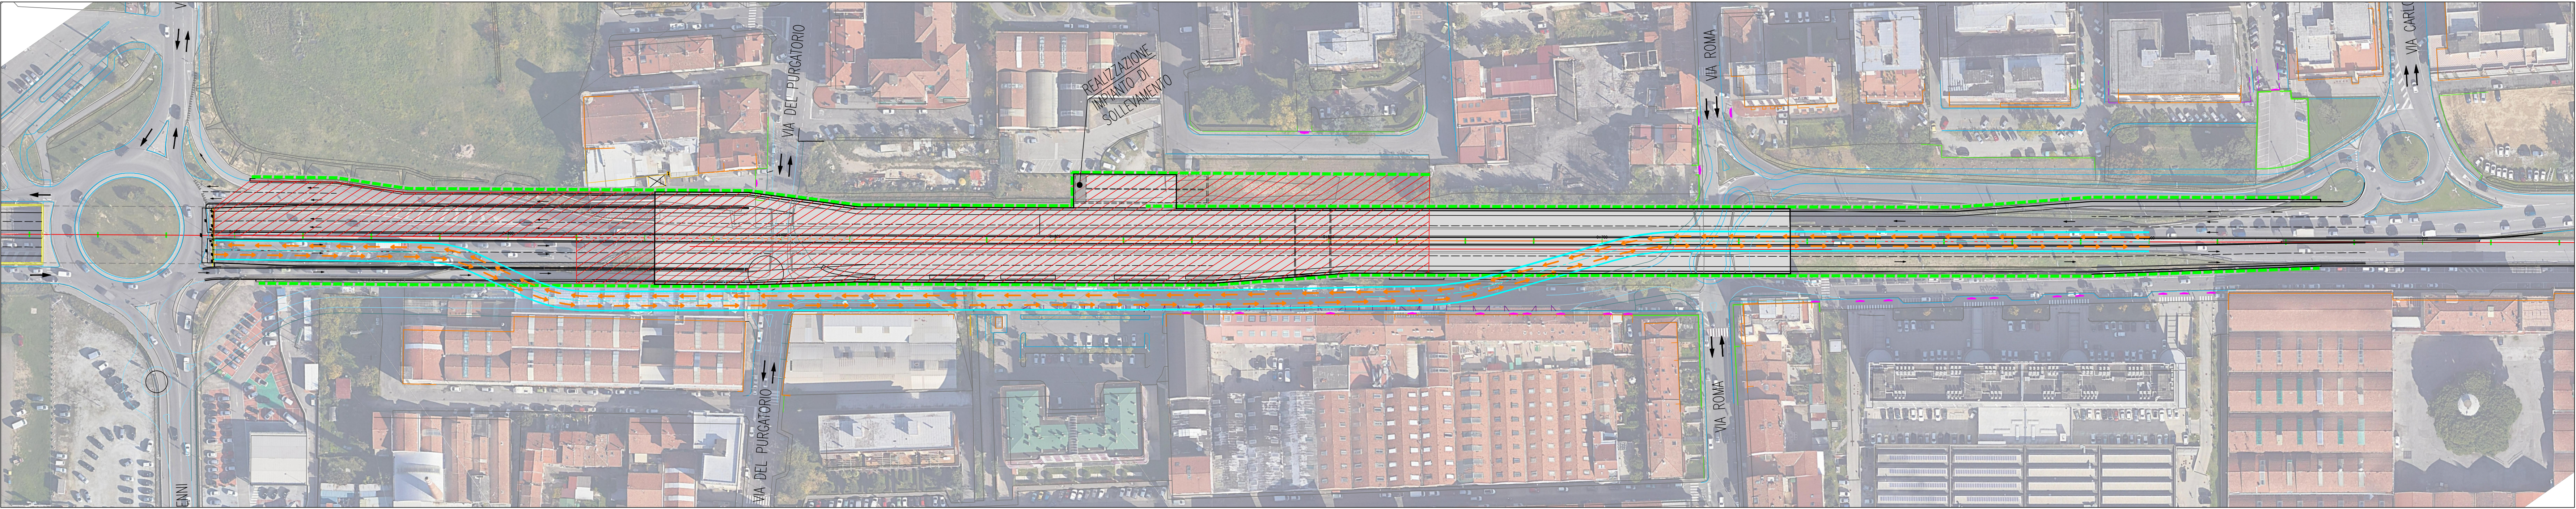

FASE 3 - REALIZZAZIONE TRATTO EST - Apertura della corsia Nord del nuovo Sottopasso fino a via Verona e deviazione Declassata su Complanare. Chiusura di via Roma. Completamento del nuovo Sottopasso in prossimità di via Nenni e tra via Verona e via Marx.

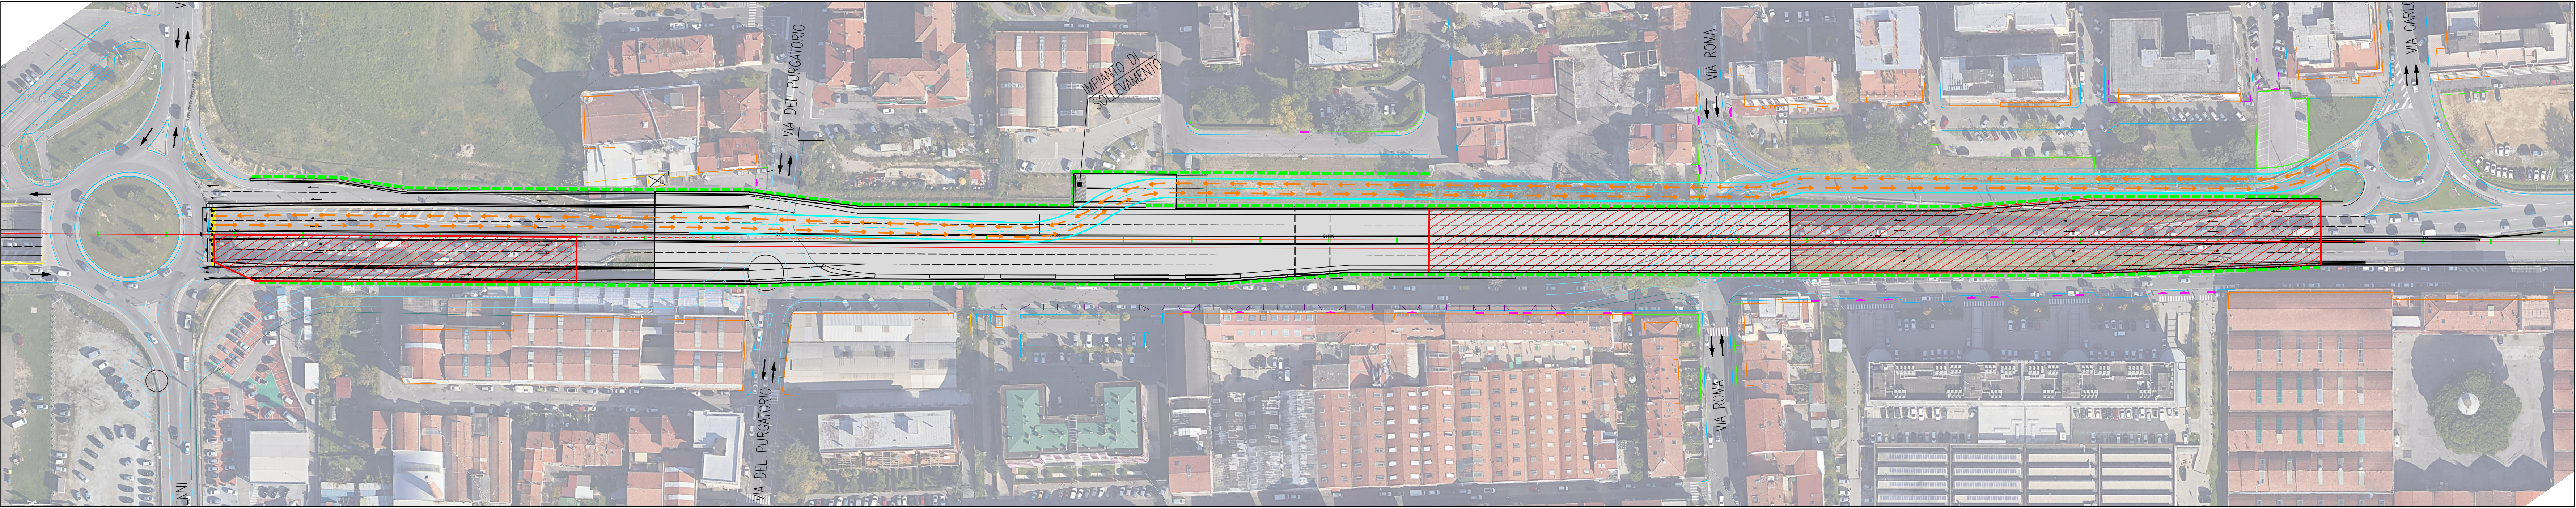

FASE 4 - COMPLETAMENTO DELL'OPERA - Apertura completa al traffico del nuovo Sottopasso e completamento delle finiture del parco in superficie.

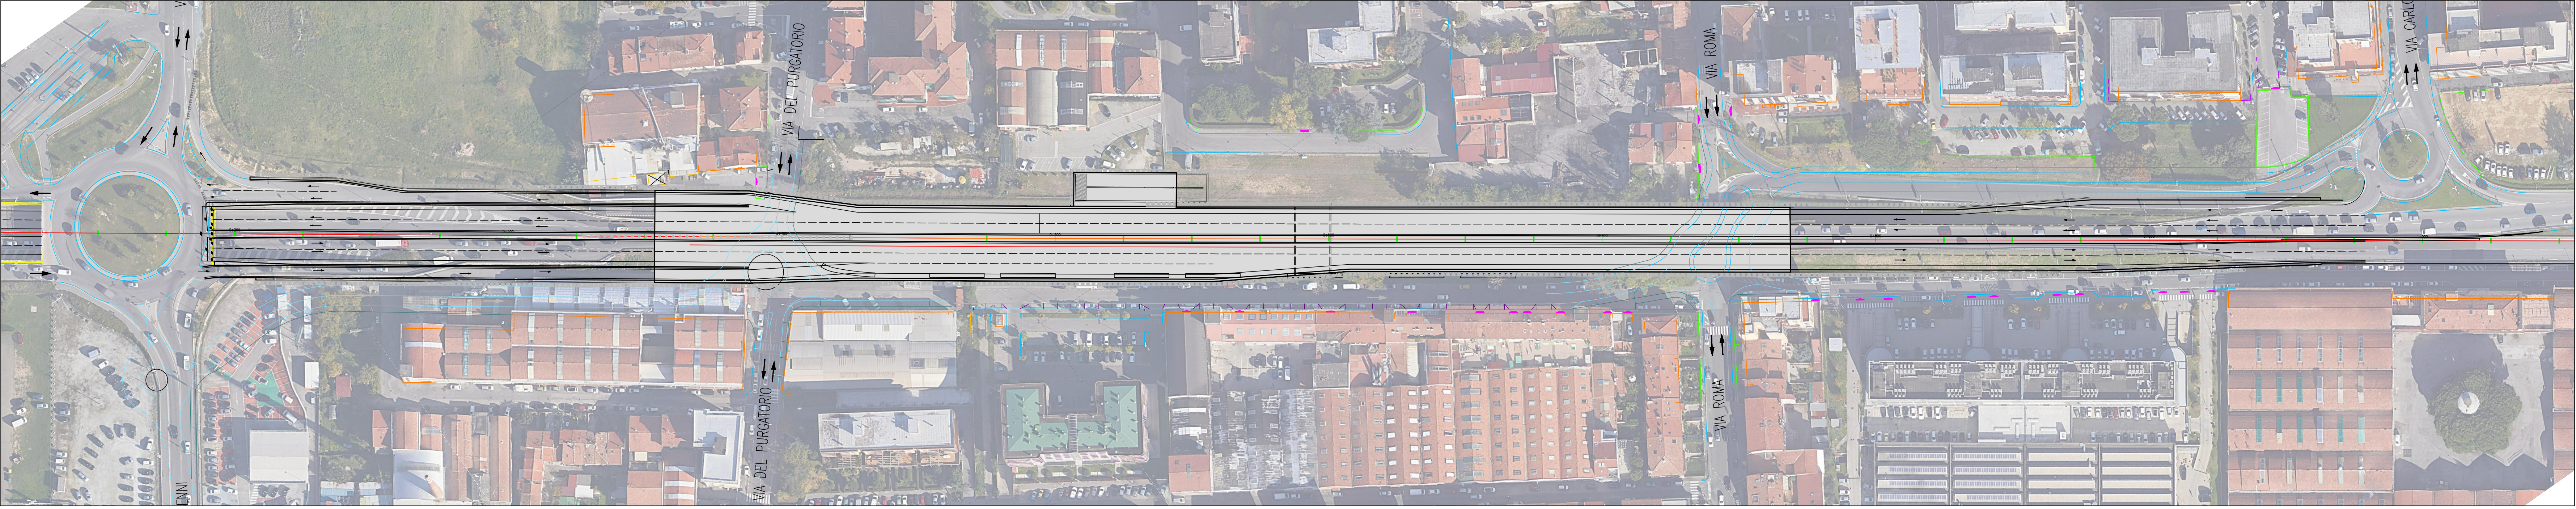

- LEGENDA
- PALIFICATA IN COSTRUZIONE
 - PALIFICATA REALIZZATA
 - ZONE DI LAVORAZIONE DURANTE LA FASE DI RIFERIMENTO
 - VIABILITA' PROVVISORIA DURANTE LA FASE DI RIFERIMENTO
 - VIABILITA' DEFINITIVA, POST OPERAM, AL CONTORNO ED IN SUPERFICIE AL SOTTOPASSO DI PROGETTO

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Anas Spa Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000 - Iscr. R.E.A. 1024991 - P.IVA 001336810003 - C.F. 00208490567
Sede legale: Via Novoromano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 49461 - Fax 06 4456224
Sede di Firenze - Viale de' Medici, 36 - 50131 - Tel. 055 56401 - Fax 055 573497

Coordinamento Territoriale Centro

**Asse stradale di collegamento tra gli svincoli
di Prato Est e Prato Ovest
"Declassata di Prato"**

**Raddoppio di Viale Leonardo da Vinci nel tratto
compreso tra Via Marx e Via Nenni mediante la
realizzazione di un sottopasso**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

IL PROGETTISTA
ing. Daniela Salucci

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE PER LA PARTE
STRADALE E STRUTTURE
ing. Luca Piacentini

STUDIO TECNICO
S&G M
Prof. Ing. Roberto Giovanni Morini

INGEGNERI

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE
ing. Salvatore Giacomo Morano

IL RESPONSABILE GEOLOGIA
geol. Simone Santoro

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Antonio Scalamanfrè

TITOLO

CANTIERIZZAZIONE - FASI

CODICE PROGETTO	PROGETTO	LV. PROJ.	N. PROJ.	NOME FILE	T00_P500_CAN_CR00_A	REVISIONE	SCALA
COF103	B	1701		CODICE EDAS	T00P500CANCR00	A	1:1000

C							
B							
A	EMISSIONE	14/02/2018	A. PIACENTINI	A. PIACENTINI	L. PIACENTINI		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO		
